



**AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA IMPLEMENTAÇÃO DO
PLANO DE BACIA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA
PIABANHA**

ANO 3 - 2024

PIRH-PS

Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul




março, 2024


PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Piabanha


Avanço do Plano
Ano 3

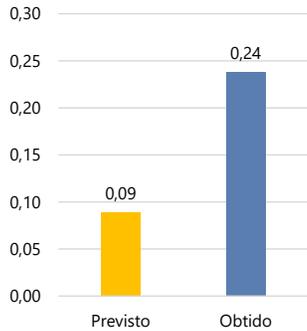

Avanço do Plano
Total

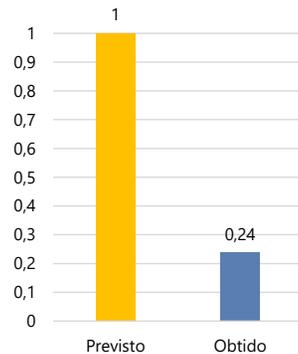

Totalização das Ações

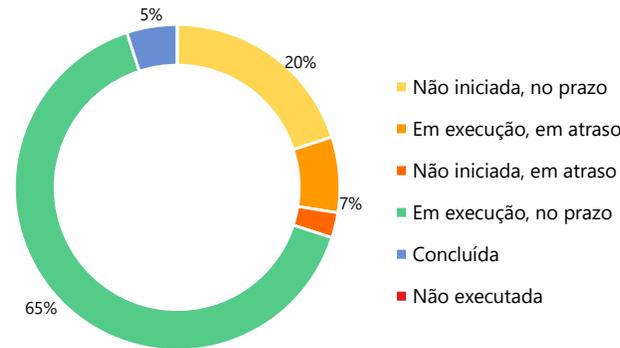

Totalização das ações

Não iniciada, no prazo	8
Em execução, em atraso	3
Não iniciada, em atraso	1
Em execução, no prazo	26
Concluída	2
Não executada	0

Implementação

Ano 3 **267%**


Acumulado **24%**

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
1.1 - Fortalecimento Institucional	1.1.1 - Compatibilização dos Interesses Internos e Externos da Região Hidrográfica	1.1.1.1 - Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos (SGRH)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13		
				0,00	0,00						
		1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.2 - Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	0,00	0,50	0,00	0,15				
			1.1.2.3 - Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH e estagiários	0,00	0,00						
			1.1.2.4 - Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG)	0,00	0,00						
			1.1.2.5 - Manter a interação com as prefeituras da área de abrangência da RH-IV, com foco em divulgar as ações do CBH e integrar os entes dos sistemas	0,00	0,25						
	1.1.3 - Aprimoramento, Fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 - Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia		0,00	0,00	0,25	0,25				
				1,00	1,00						
		1.1.3.2 - Realizar a revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do Contrato de Gestão		0,00	0,00						
				0,00	0,00						
				0,00	0,00						
				0,00	0,00						
1.1.3.3 - Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão	0,00	0,00									
1.1.3.4 - Promover a participação dos colaboradores da Entidade Delegatária em capacitações relacionadas a recursos hídricos	0,00	0,00									


PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Piabanhá


Avanço do Plano
Ano 3

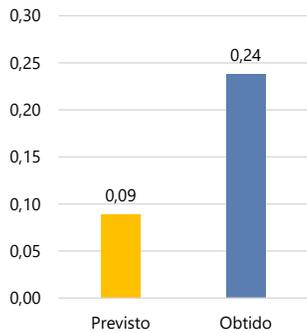

Avanço do Plano
Total

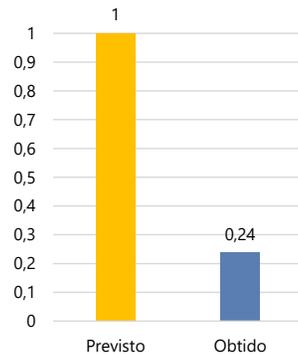

Totalização das Ações

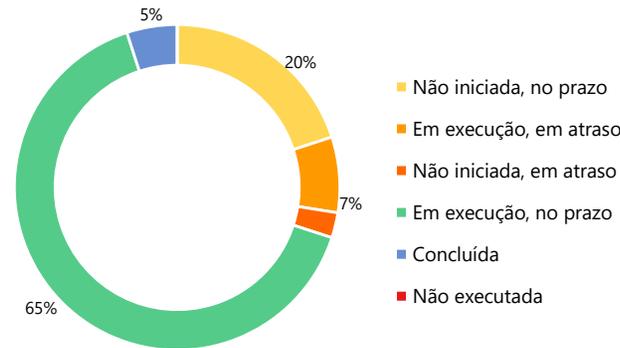

Totalização das ações

Não iniciada, no prazo	8
Em execução, em atraso	3
Não iniciada, em atraso	1
Em execução, no prazo	26
Concluída	2
Não executada	0

Implementação




Ano 3 267%

Acumulado 24%

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2 - Instrumentos de Gestão	1.2.1 - Outorga	1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na RH-IV	0,75	0,25	0,38	0,13	0,35	0,25	0,18	0,11
			1.2.1.2 - Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de emissão de outorga para a RH-IV	0,00	0,00						
		1.2.2 - Cobrança	1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na RH-IV, em atendimento às metas do Contrato de Gestão	1,00	0,50	1,00	0,50				
			1.2.3 - Enquadramento	1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	0,75	0,75	0,38				
		1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação		0,00	0,50						
		1.2.4 - Plano de Bacia Hidrográfica	1.2.4.1 - Criar e manter o Grupo de Acompanhamento do Plano (GAP)	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.2.4.2 - Realizar atualizações periódicas do orçamento, a cada 5 anos, e atualização completa do Plano de Bacia a partir 12º ano.		0,00	0,00							
	1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH da RH-IV		0,00	0,00							
	1.2.5 - Sistema de Informações	1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IV e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH, inclusive o levantamento de novas informações.	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.3 - Unidades Especiais de Gestão (UEGs)	1.3.1 - Criação de UEGs e Indicação de Manejos Diferenciados	1.3.1.1 - Estudar, pactuar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão (UEGs) e definir as necessidades de manejo diferenciado e possíveis restrições de uso	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00		

PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Piabanha

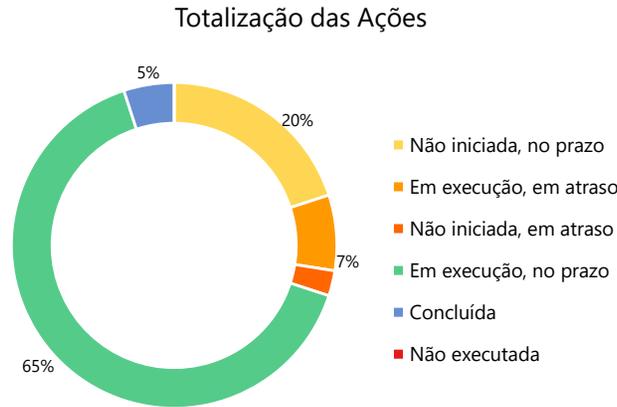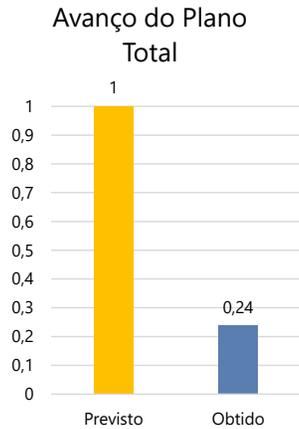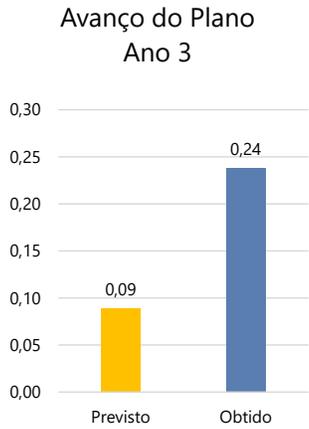

Totalização das ações

Não iniciada, no prazo	8
Em execução, em atraso	3
Não iniciada, em atraso	1
Em execução, no prazo	26
Concluída	2
Não executada	0

Implementação


Ano 3	267%
Acumulado	24%

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global		
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	
	1.4 - Eventos Críticos	1.4.1 - Plano de Gerenciamento de Risco	1.4.1.1 - Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	0,25	0,25							
			1.4.1.2 - Elaborar estudos de medidas para gerenciamento de riscos de desastres naturais na RH-IV e Projeto/Plano de intervenção e mitigação	0,00	0,00	0,08	0,08			0,04	0,04	
			1.4.1.3 - Execução do Projeto/Plano de intervenção e mitigação dos desastres naturais	0,00	0,00							
		1.4.2 - Ações emergenciais	1.4.2.1 - Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00					
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.1 - Água Superficial	2.1.1 - Equacionamento de Problemas de Balanço Hídrico Quali-quantitativo	2.1.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.2 - Água Subterrânea	2.2.1 - Uso Sustentável da Água Subterrânea	2.2.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo sobre a água subterrânea na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial	2.3.1 - Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa existente	2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		0,06	0,19
			2.3.2 - Melhoria, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.1 - Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo CBH	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50		
	3.1 - Esgotamento	3.1.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas	3.1.1.1 - Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	0,00	1,00							


PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Piabanhã

Avanço do Plano
Ano 3

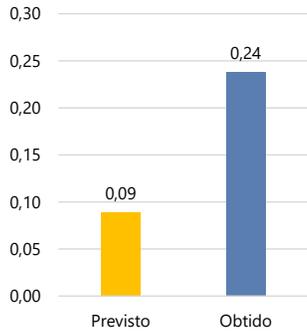

Avanço do Plano
Total

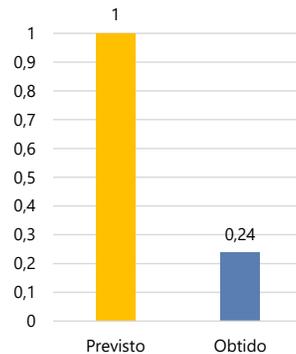

Totalização das Ações



Totalização das ações

Não iniciada, no prazo	8
Em execução, em atraso	3
Não iniciada, em atraso	1
Em execução, no prazo	26
Concluída	2
Não executada	0




Implementação

Ano 3 267%

Acumulado 24%

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
3 - Saneamento Urbano e Rural	Sanitário	de Esgotamento Sanitário	3.1.1.2 - Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP)	1,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,17	0,17
	3.2 - Resíduos Sólidos	3.2.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento das Áreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos	3.2.1.1 - Viabilizar relatório sobre resíduos sólidos para divulgação aos órgãos pertinentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3 - Drenagem Urbana	3.3.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Drenagem Urbana	3.3.1.1 - Viabilizar relatório sobre drenagem urbana para divulgação aos órgãos pertinentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 - Infraestrutura verde	4.1 - Planejamento Territorial	4.1.1 - Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias	4.1.1.1 - Formalizar a indicação de bacias hidrográficas prioritárias para elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	1,00	1,00	0,50	0,88	0,25	0,94	0,13	0,84
			4.1.1.2 - Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	0,00	0,75						
	4.2 - Intervenções na Paisagens	4.2.1 - Restauração e Conservação de Bacias Hidrográficas e reabilitação de corpos hídricos	4.2.1.1 - Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75		
			4.2.1.2 - Identificar, mobilizar e formalizar acordos e parcerias com vistas à execução de ações de recuperação ambiental e manejo do solo	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
5 - Produção de conhecimento	5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão	5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Comunicação e Educação	6.1 - Comunicação	6.1.1 - Gestão de Comunicação	6.1.1.1 - Realizar a revisão do Plano de Ações de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
			6.1.1.2 - Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	0,00	0,00						

PAINEL
Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Piabanha

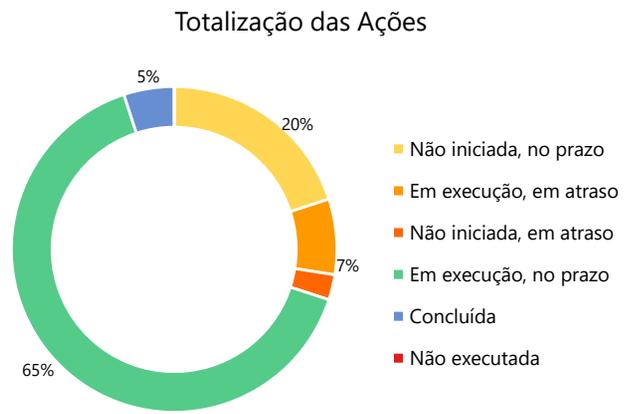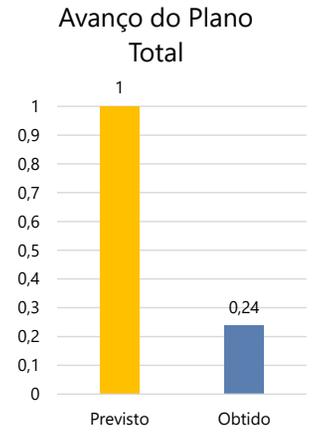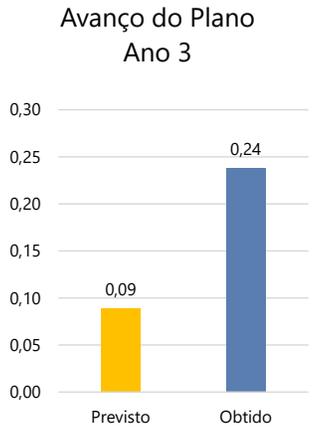

Totalização das ações

Não iniciada, no prazo	8
Em execução, em atraso	3
Não iniciada, em atraso	1
Em execução, no prazo	26
Concluída	2
Não executada	0

Implementação

Ano 3	267%
Acumulado	24%


Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
Ambiental	6.2 - Educação Ambiental	6.2.1 - Educação Ambiental	6.2.1.1 - Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25		

Ação 1.1.1.1 - Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos (SGRH)

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.1 - Compatibilização dos Interesses Internos e Externos da Região Hidrográfica
Meta	Participação em, ao menos, 70% das reuniões nas quais o CBH possui cadeira
Atividades previstas	Participar das reuniões e propor encaminhamentos Executar os encaminhamentos
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Participação nas reuniões e propor encaminhamentos Execução dos encaminhamentos		
Principais constatações	O Comitê vem participando das instâncias de integração de forma constante, cabendo destacar o Grupo de Trabalho Enquadramento.		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma participação realizada	2023	0	0
70% de participação durante quatros anos	2025	0,25	
70% de participação durante oito anos	2029	0,5	
70% de participação durante doze anos	2033	0,75	
70% de participação em todos os anos da vigência do PBH	2036	1	

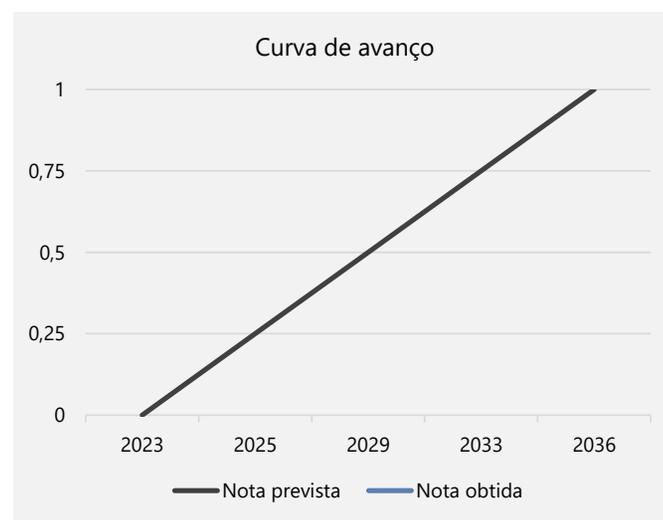


Ação 1.1.2.1 - Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê
Meta	Viabilização de 100% das solicitações de participação em eventos internos e externos
Atividades previstas	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 870.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Custeio das atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 1.1.2.1 - Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma participação realizada	2023	0	0
100% das solicitações viabilizadas durante quatro anos	2025	0,25	
100% das solicitações viabilizadas durante oito anos	2029	0,5	
100% das solicitações viabilizadas durante doze anos	2033	0,75	
100% das solicitações viabilizadas em todos os anos da vigência do PBH	2036	1	

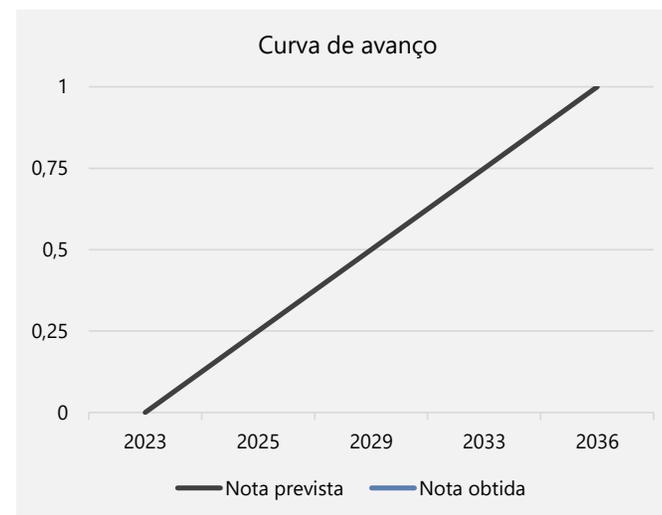

Ação 1.1.2.2 - Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê
Meta	Participação de membros do Comitê em 15 capacitações
Atividades previstas	Seminário Inundações - Organização e realização Palestras de capacitação - Organização e realização
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 526.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,50
Atividades executadas	Seminário "Existem soluções para as inundações em Petrópolis?" Palestras de Capacitação: "Cidades Inteligentes"; "Modelagem Ambiental e Computacional de Bacias Hidrográficas Representativas da Mata Atlântica Brasileira"; "Sistemas de informação para qualidade da água para consumo humano: desafios para vigilância ambiental"; "Geoparque Montanhas: uma proposta na interface entre desastres, montanhismo e geoconservação"; "Sobreviventes de desastres: as multidimensões de um campo ferido"		
Principais	-		
Recomendações	-		

Ação 1.1.2.2 - Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma participação realizada	2023	0	0,5
4 participações realizadas	2025	0,25	
8 participações realizadas	2029	0,5	
12 participações realizadas	2033	0,75	
15 participações realizadas	2036	1	




Ação 1.1.2.3 - Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH e estagiários

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê
Meta	Viabilização, custeio e mantimento do funcionamento do(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH
Atividades previstas	Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH e estagiários
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 3.687.200,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Escritório(s) de Projeto(s) do CBH e estagiários		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum projeto apoiado	2023	0	0
EP em funcionamento durante quatro anos	2025	0,25	
EP em funcionamento durante oito anos	2029	0,5	
EP em funcionamento durante doze anos	2033	0,75	
EP em funcionamento em todos os anos da vigência do PBH	2036	1	

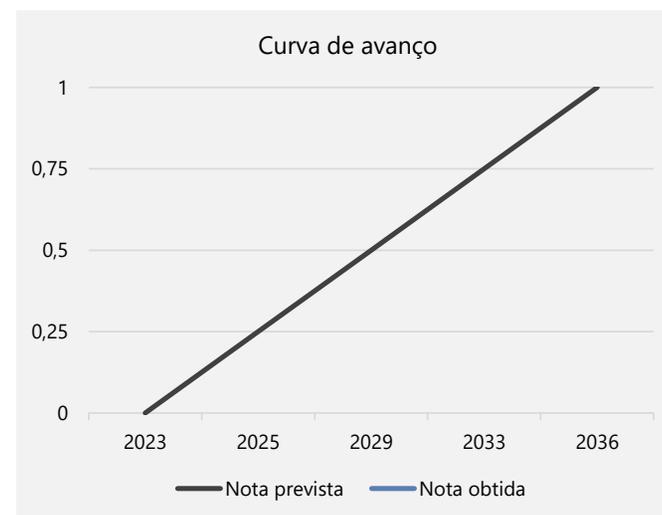


Ação 1.1.2.4 - Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG)

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê
Meta	Relatório anual do GACG elaborado e publicado
Atividades previstas	Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG)
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Organização e apoio à realização das reuniões do GACG		
Principais	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
4 relatórios elaborados	2025	0,25	
8 relatórios elaborados	2029	0,5	
12 relatórios elaborados	2033	0,75	
15 relatórios elaborados	2036	1	

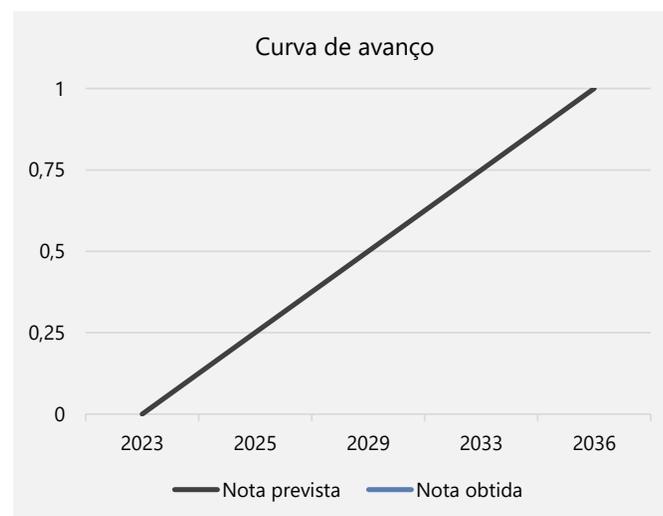

Ação 1.1.2.5 - Manter a interação com as prefeituras da área de abrangência da RH-IV, com foco em divulgar as ações do CBH e integrar os entes dos sistemas

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê
Meta	Realização de 8 reuniões ou atividades com as prefeituras da RH-IV
Atividades previstas	Mobilizar municípios para participação efetiva no Comitê
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,25
Atividades executadas	Mobilização de municípios para participação efetiva no Comitê		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0,25
2 reuniões ou atividades realizadas	2025	0,25	
4 reuniões ou atividades realizadas	2029	0,5	
6 reuniões ou atividades realizadas	2033	0,75	
8 reuniões ou atividades realizadas	2036	1	




Ação 1.1.3.1 - Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.3 - Aprimoramento, Fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária
Meta	Viabilização dos recursos financeiros para a manutenção da Entidade Delegatária em cumprimento ao Contrato de Gestão
Atividades previstas	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 5.620.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 1.1.3.1 - Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
recurso aportado durante quatro anos	2025	0,25	
recurso aportado durante oito anos	2029	0,5	
recurso aportado durante doze anos	2033	0,75	
recurso aportado em todos os anos da vigência do PBH	2036	1	

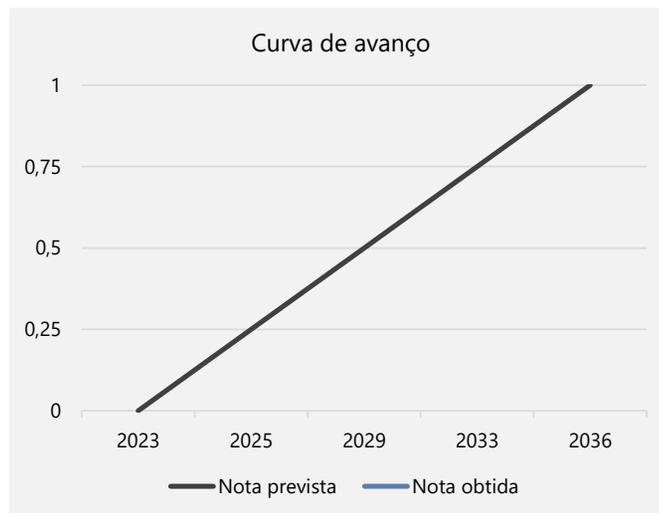


Ação 1.1.3.2 - Realizar a revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do Contrato de Gestão

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.3 - Aprimoramento, Fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária
Meta	Realização da revisão do fluxo de gestão entre o 1º e o 3º ano de vigência do PBH
Atividades previstas	Elaborar as especificações técnicas para a revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	1,00	Nota alcançada	1,00
Atividades executadas	Ação realizada pela Gerência de Gestão Estratégica da AGEVAP		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
especificação técnica para a revisão do fluxo de gestão e planejamento elaborada	2022	0,25	0,25
revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégicos em andamento	2023	0,5	0,5
revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégicos concluída	2023	0,75	1
revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégicos aprovada	2024	1	1

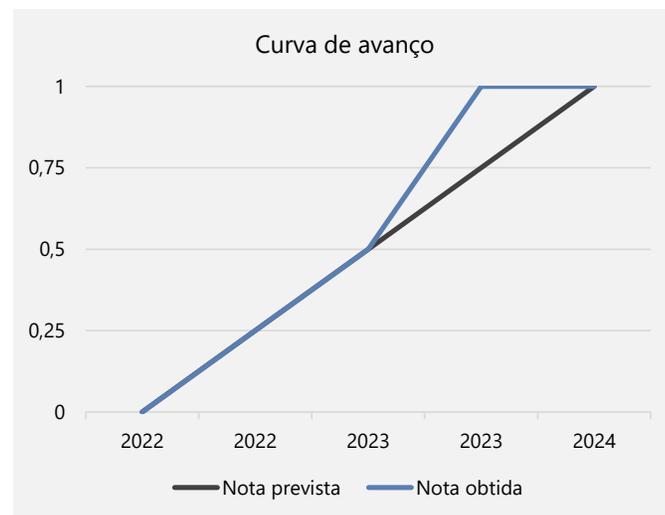


Ação 1.1.3.3 - Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.3 - Aprimoramento, Fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária
Meta	Avaliação da necessidade e possibilidade de ampliação e manutenção da estrutura da Entidade Delegatária, durante o 4º e 5º ano de implementação do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
1ª reunião de alinhamento sobre a avaliação realizada	2025	0,25	
2ª reunião de alinhamento sobre a avaliação realizada	2025	0,5	
avaliação em realização	2026	0,75	
avaliação da necessidade e possibilidade da ampliação e manutenção concluída	2026	1	

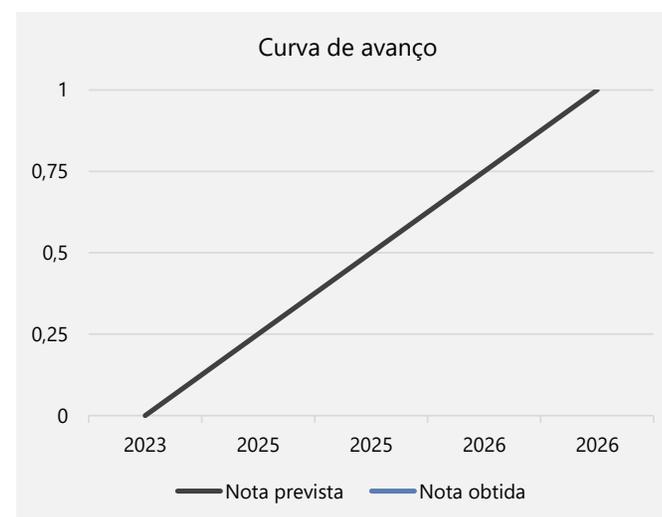


Ação 1.1.3.4 - Promover a participação dos colaboradores da Entidade Delegatária em capacitações relacionadas a recursos hídricos

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.3 - Aprimoramento, Fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária
Meta	Participação dos colaboradores em 15 cursos de aprimoramento técnico
Atividades previstas	Realizar constante levantamento dos eventos e das capacitações relacionados às atividades desempenhadas pelos colaboradores Definir os colaboradores para participação no evento ou na capacitação Participar dos eventos de treinamento e capacitação Receber o certificado de realização da capacitação Acompanhar a realização das capacitações, principalmente no que tange ao atendimento das metas do CG
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Levantamento dos eventos e das capacitações relacionados às atividades desempenhadas pelos colaboradores; definição dos colaboradores para participação no evento ou na capacitação; participação nos eventos de treinamento e capacitação; certificado de realização da capacitação; realização das capacitações, principalmente no que tange ao atendimento das metas do CG		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 1.1.3.4 - Promover a participação dos colaboradores da Entidade Delegatária em capacitações relacionadas a recursos hídricos

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma participação realizada	2022	0	0
4 participações realizada	2025	0,25	
8 participações realizadas	2029	0,5	
12 participações realizadas	2033	0,75	
15 participações realizadas	2036	1	

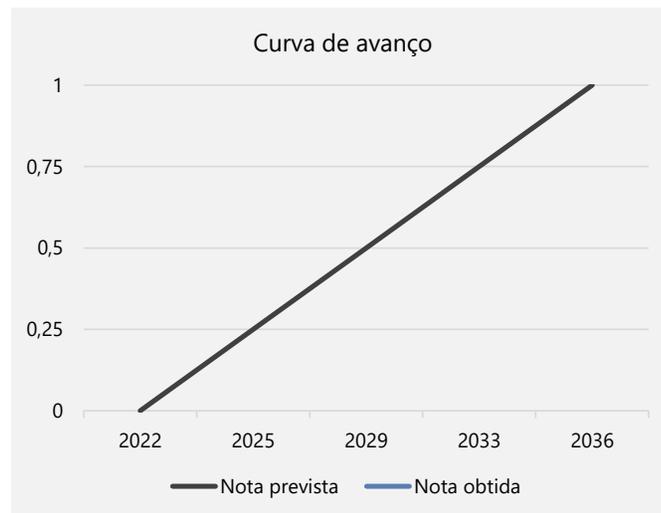


Ação 1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na RH-IV

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.1 - Outorga
Meta	Publicação de resolução sobre as diretrizes para aperfeiçoamento do instrumento da outorga propostas pelo comitê até o 4º ano de implementação do PBH
Atividades previstas	Aprovação de Plano de Trabalho para discussão das diretrizes da outorga para execução ser iniciada no 2º ano do PBH
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, em atraso		
Nota prevista	0,75	Nota alcançada	0,25
Atividades executadas	-		
Principais constatações	Pendente a aprovação do Plano de Trabalho; Outros instrumentos foram discutidos ao longo do ano, como cobrança e enquadramento.		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
plano de trabalho definido	2022	0,25	0,25
2 oficinas realizada	2023	0,5	0,25
minuta de resolução apresentada ao órgão gestor	2024	0,75	0,25
resolução publicada	2025	1	

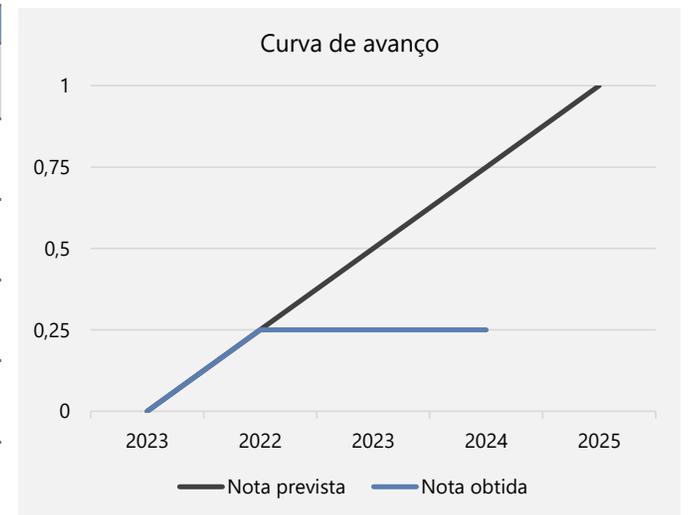


Ação 1.2.1.2 - Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de emissão de outorga para a RH-IV

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.1 - Outorga
Meta	Realização de 15 divulgações de dados e informações referentes ao tema outorga na vigência do PBH
Atividades previstas	Solicitar dados ao INEA Realizar tratamento dos dados recebidos Realizar divulgação de dados e informações sobre outorga
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Solicitação de dados ao INEA		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma divulgação realizada	2023	0	0
4 divulgações realizadas	2025	0,25	
8 divulgações realizadas	2029	0,5	
12 divulgações realizadas	2033	0,75	
15 divulgações realizadas	2036	1	

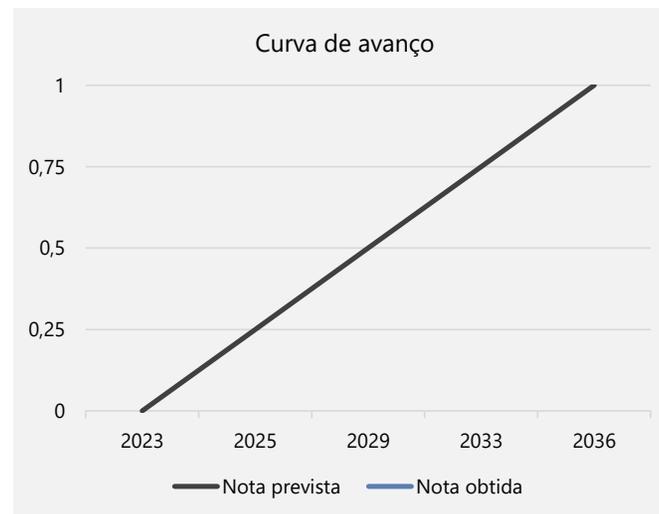


Ação 1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na RH-IV, em atendimento às metas do Contrato de Gestão

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.2 - Cobrança
Meta	Publicação de resolução sobre as diretrizes para aperfeiçoamento do instrumento da cobrança propostas pelo comitê até o 3º ano de implementação do PBH
Atividades previstas	Realizar discussões sobre o estudo de impacto dos valores praticados na cobrança sobre os diferentes segmentos de usuários
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, em atraso		
Nota prevista	1,00	Nota alcançada	0,50
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
meta do CG para 2021 cumprida	2022	0,25	0,25
meta do CG para 2022 cumprida	2023	0,5	0,5
minuta de resolução apresentada ao órgão gestor	2023	0,75	0,5
resolução publicada	2024	1	0,5

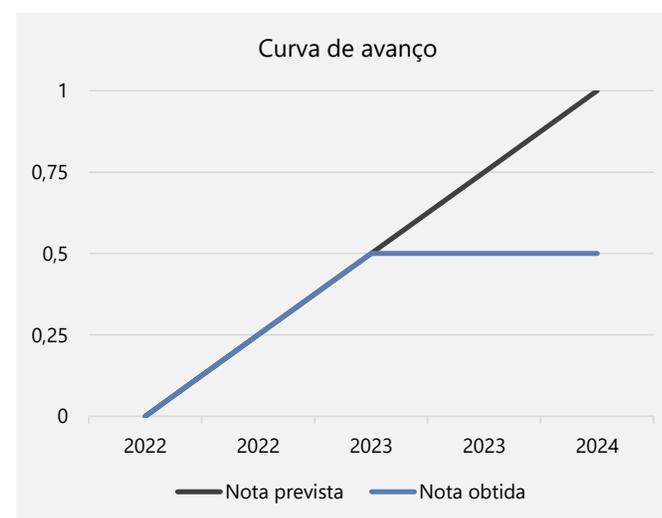


Ação 1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.3 - Enquadramento
Meta	Conclusão do estudo técnico inicial para construção da proposta de enquadramento
Atividades previstas	Realizar/contratar estudo da etapa técnica propositiva do Enquadramento (Diganóstico, Prognóstico e Plano de Ações - Calha Principal do Piabanha) Acompanhar a contratação do estudo Aprovar Resolução - Resolução Enquadramento UCs de Proteção Integral Encaminhar para INEA e CERHI - Resolução Enquadramento UCs de Proteção Integral
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 1.750.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,75	Nota alcançada	0,75
Atividades executadas	Em andamento - contrato CEIVAP da empresa para os estudos técnicos iniciais Grupo de trabalho criado e reuniões em andamento Em andamento - contratação de enquadramento do alto Piabanha Resolução de enquadramento de unidades de conservação de proteção integral encaminhada ao INEA para avaliação		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma reunião realizada	2022	0	0
designar técnico da ED para acompanhamento	2023	0,25	0,5
subsidiar o estudo com dados técnicos	2024	0,5	0,5
presença do CBH em 70% dos eventos previstos	2024	0,75	0,75
estudo técnico apresentado ao comitê	2025	1	

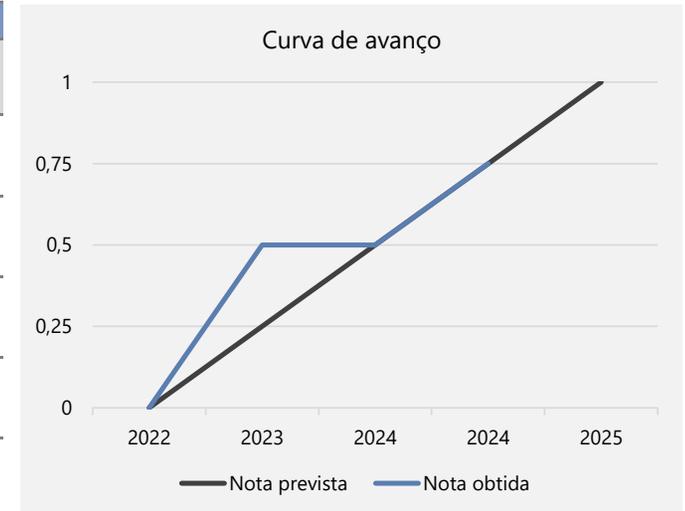


Ação 1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.3 - Enquadramento
Meta	Elaboração e aprovação de proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação para a RH IV, entre o 3º e 8º ano de implementação do PBH.
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 558.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,50
Atividades executadas	Contratação do enquadramento do alto curso do Rio Piabanha em andamento.		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0,5
Termo de referência elaborado	2025	0,25	0,5
Proposta e programa em andamento	2026	0,5	
Proposta e programa concluídos	2028	0,75	
Proposta e programa aprovados	2029	1	

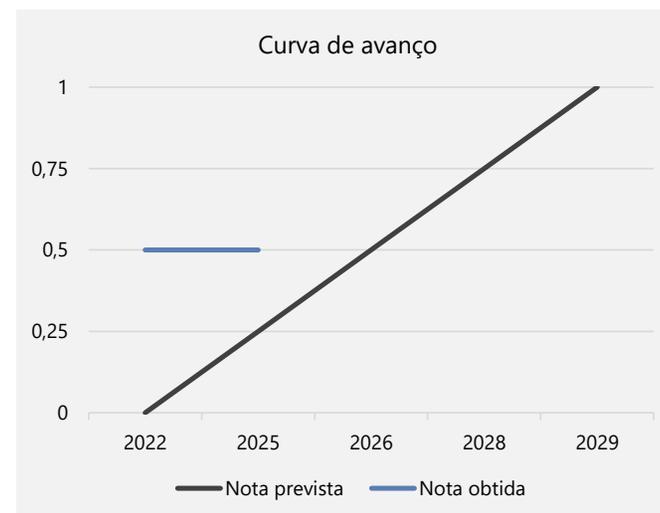


Ação 1.2.4.1 - Criar e manter o Grupo de Acompanhamento do Plano (GAP)

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.4 - Plano de Bacia Hidrográfica
Meta	Criação e operação do GAP por toda a vigência do PBH, por meio de reuniões semestrais
Atividades previstas	Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento dos PBHs e PDRHs Elaborar informe do andamento da execução dos PBHs e PDRHs (Ação 1.2.4.3 dos PBHs e PDRHs) Divulgar andamento da execução dos PBHs e PDRHs
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Reuniões periódicas de avaliação do andamento dos PBHs e PDRHs; informe do andamento da execução dos PBHs e PDRHs (Ação 1.2.4.3 dos PBHs e PDRHs); divulgação do andamento da execução dos PBHs e PDRHs		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 1.2.4.1 - Criar e manter o Grupo de Acompanhamento do Plano (GAP)

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma reunião realizada	2023	0	0
8 reuniões realizadas	2025	0,25	
16 reuniões realizadas	2029	0,5	
24 reuniões realizadas	2033	0,75	
30 reuniões realizadas	2036	1	

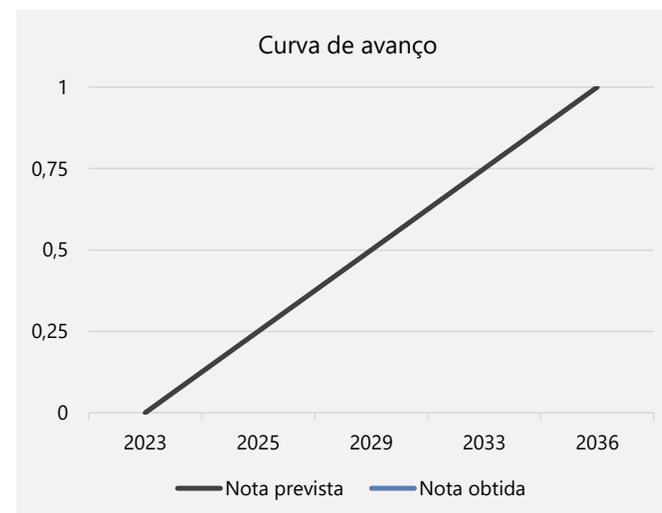


Ação 1.2.4.2 - Realizar atualizações periódicas do orçamento, a cada 5 anos, e atualização completa do Plano de Bacia a partir 12º ano.

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.4 - Plano de Bacia Hidrográfica
Meta	Realização de 2 atualizações do orçamento do PBH e 1 atualização completa do PBH, durante o prazo de implementação do PBH (15 anos)
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 1.200.000,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atualização realizada	2022	0	0
pelo menos 1 atualização do orçamento realizada	2026	0,25	
pelo menos 2 atualizações do orçamento realizadas	2031	0,5	
pelo menos 2 atualizações do orçamento realizadas e revisão completa em andamento	2033	0,75	
pelo menos 2 atualizações do orçamento e 1 atualização do PBH realizadas	2036	1	

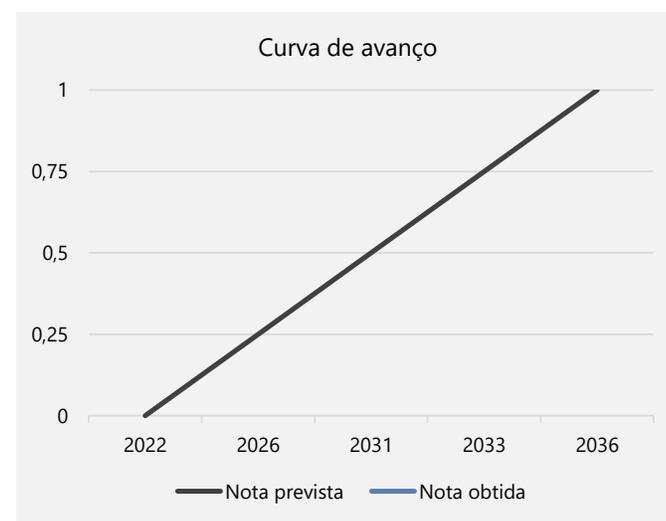


Ação 1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH da RH-IV

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.4 - Plano de Bacia Hidrográfica
Meta	Realização de 15 divulgações da situação de implementação do PBH
Atividades previstas	Elaborar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH Apresentar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH na plenária do CBH Divulgar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Elaboração do relatório de situação anual acerca da implementação do PBH, apresentação e divulgação		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH da RH-IV

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma divulgação realizada	2032	0	0
4 divulgações realizadas	2025	0,25	
8 divulgações realizadas	2029	0,5	
12 divulgações realizadas	2033	0,75	
15 divulgações realizadas	2036	1	

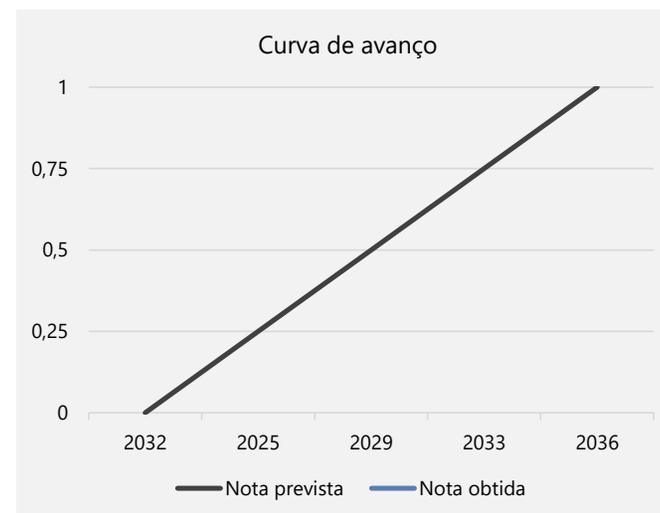


Ação 1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IV e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH, inclusive o levantamento de novas informações.

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.5 - Sistema de Informações
Meta	Manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH IV durante a vigência do PBH, inclusive o levantamento de novas informações.
Atividades previstas	Encaminhar demandas de manutenção e atualização do SIGA Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIGA Acompanhar a contratação Apresentar prestação de contas do andamento do contrato nos CBHs
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 1.020.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Encaminhamento de demandas de manutenção e atualização do SIGA; manutenção e aperfeiçoamento do SIGA; acompanhamento da contratação		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IV e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH, inclusive o levantamento de novas informações.

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
sistema sem funcionamento	2023	0	0
sistema em funcionamento durante quatro anos	2025	0,25	
sistema em funcionamento durante oito anos	2029	0,5	
sistema em funcionamento durante doze anos	2033	0,75	
sistema em funcionamento em todos os anos da vigência do PBH	2036	1	

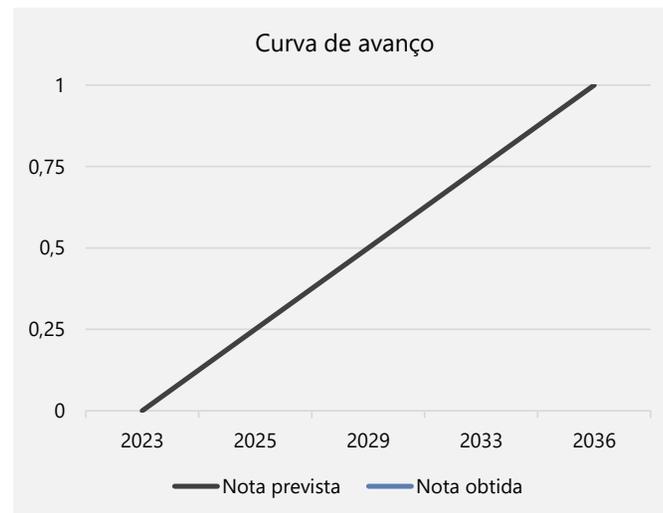


Ação 1.3.1.1 - Estudar, pactuar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão (UEGs) e definir as necessidades de manejo diferenciado e possíveis restrições de uso

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.3 - Unidades Especiais de Gestão (UEGs)
Programa	1.3.1 - Criação de UEGs e Indicação de Manejos Diferenciados
Meta	Estudo e proposta de UEGs entre o 3º e 8º ano de vigência do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, em atraso		
Nota prevista	0,25	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
1 reunião relativa as UEGs realizada	2024	0,25	0
1 oficina realizada	2025	0,5	
proposta de UEGs concluída	2027	0,75	
proposta de UEGs apresentada ao órgão gestor	2029	1	

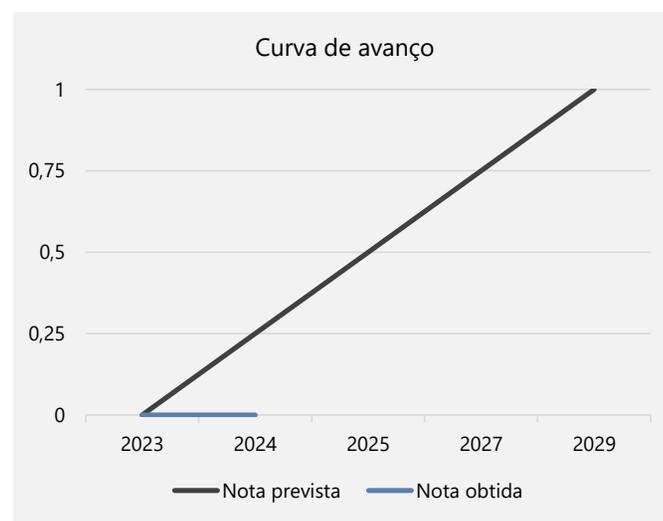


Ação 1.4.1.1 - Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.4 - Eventos Críticos
Programa	1.4.1 - Plano de Gerenciamento de Risco
Meta	Divulgação do Plano de Gerenciamento de Riscos aos órgãos pertinentes de sua área de atuação entre o 3º e 5º ano de vigência do PBH
Atividades previstas	Participar de reuniões, eventos e contribuir na elaboração do PGR da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 878.404,03

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,25	Nota alcançada	0,25
Atividades executadas	Reuniões, eventos e contribuição na elaboração do PGR da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul		
Principais constatações	Seminário "Resultados do Plano de Gerenciamento de Risco da Bacia do Paraíba do Sul". Divulgação realizada através de e-mail e PGR publicado no site do CEIVAP.		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0,25
1 oficina realizada	2024	0,25	0,25
1 reunião realizada	2025	0,5	
proposta de divulgação elaborada	2025	0,75	
divulgação realizada	2026	1	

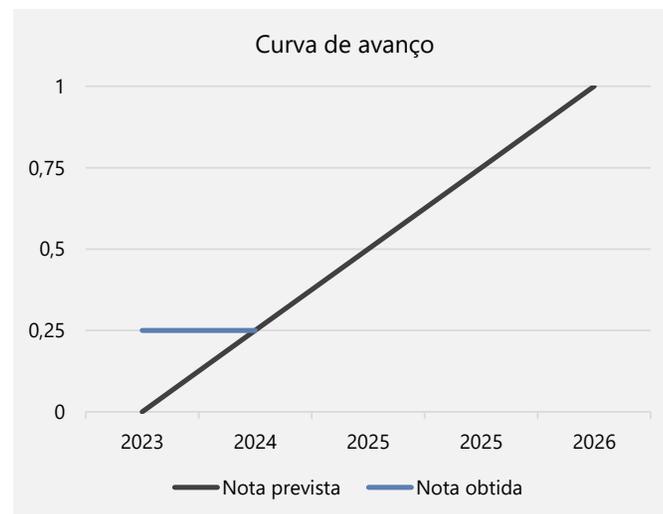


Ação 1.4.1.2 - Elaborar estudos de medidas para gerenciamento de riscos de desastres naturais na RH-IV e Projeto/Plano de intervenção e mitigação

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.4 - Eventos Críticos
Programa	1.4.1 - Plano de Gerenciamento de Risco
Meta	Elaboração do Estudo e do Projeto/Plano de intervenção e mitigação dos desastres naturais
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
termo de referência do estudo concluído	2027	0,25	
empresa contratada, estudo em elaboração	2028	0,5	
estudo concluído	2028	0,75	
estudo apresentado ao comitê	2029	1	

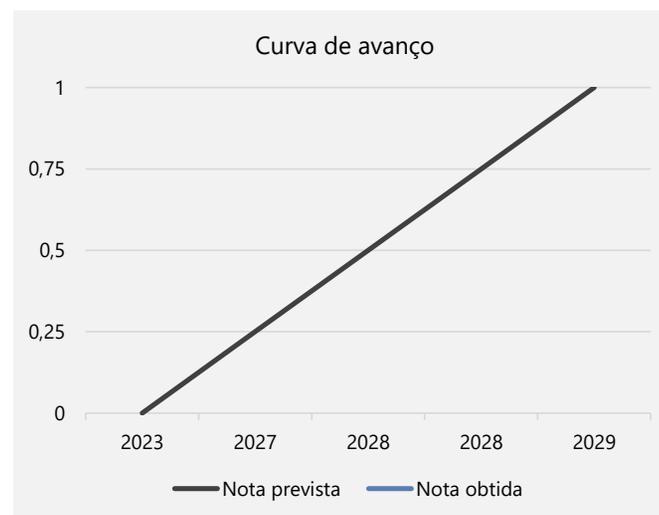


Ação 1.4.1.3 - Execução do Projeto/Plano de intervenção e mitigação dos desastres naturais

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.4 - Eventos Críticos
Programa	1.4.1 - Plano de Gerenciamento de Risco
Meta	Realização de 8 reuniões com defesa civil, prefeituras e governos
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma reunião realizada	2023	0	0
2 reuniões realizadas	2030	0,25	
4 reuniões realizadas	2032	0,5	
6 reuniões realizadas	2034	0,75	
8 reuniões realizadas	2036	1	

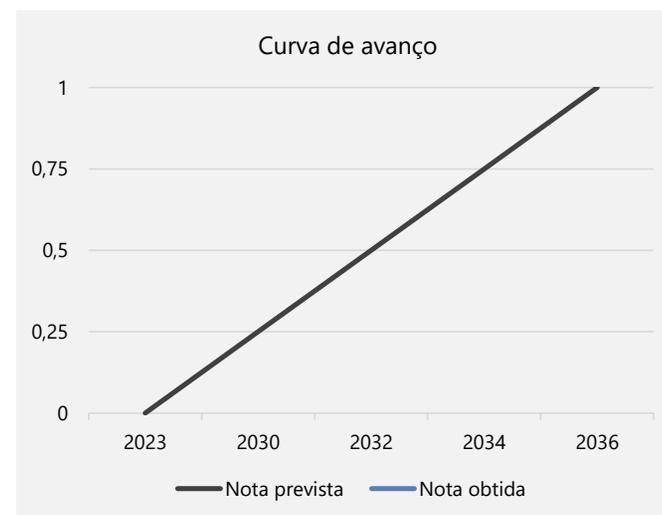


Ação 1.4.2.1 - Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.4 - Eventos Críticos
Programa	1.4.2 - Ações emergenciais
Meta	-
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

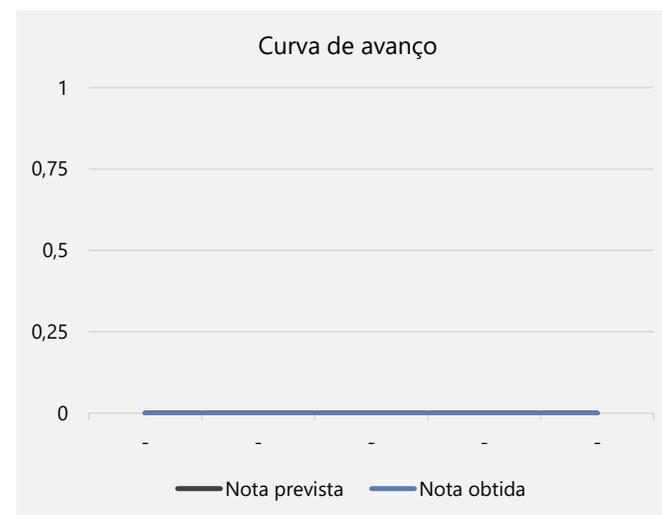


Ação 2.1.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

Ação	
Agenda	2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo
Subagenda	2.1 - Água Superficial
Programa	2.1.1 - Equacionamento de Problemas de Balanço Hídrico Quali-quantitativo
Meta	Levantamento das informações sobre os problemas de balanço hídrico para subsídio do estudo da ação 2.1.1.1 do PIRH, entre o 5º e 9º ano de implementação do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 3.040.000,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
1 reunião realizada	2026	0,25	
1 oficina realizada	2027	0,5	
consolidação das informações concluída	2028	0,75	
Envio das informações ao CEIVAP	2030	1	

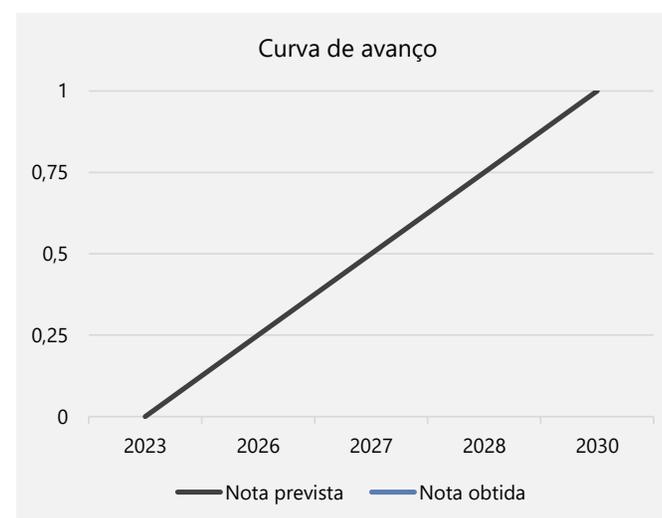

Ação 2.2.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo sobre a água subterrânea na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

Ação	
Agenda	2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo
Subagenda	2.2 - Água Subterrânea
Programa	2.2.1 - Uso Sustentável da Água Subterrânea
Meta	Levantamento das informações sobre os problemas de balanço hídrico com vistas a subsidiar o estudo da ação 2.2.1.1, entre o 6º e 9º ano de implementação do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 2.680.000,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
1 reunião realizada	2027	0,25	
1 oficina realizada	2027	0,5	
consolidação das informações concluída	2028	0,75	
Envio das informações ao CEIVAP	2030	1	




Ação 2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente

Ação	
Agenda	2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo
Subagenda	2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial
Programa	2.3.1 - Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa existente
Meta	Oficialização, 5 vezes, aos órgãos mantenedores das redes de monitoramento existente quanto a situação da operação do monitoramento quantitativo da água superficial, durante a vigência do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,25	Nota alcançada	0,25
Atividades executadas	E-mail encaminhado aos órgãos gestores acerca da rede de monitoramento existente.		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum ofício encaminhado	2023	0	0,25
1º ofício encaminhado	2025	0,25	
2º ofício encaminhado	2029	0,5	
3º ofício encaminhado	2033	0,75	
5º ofício encaminhado	2036	1	

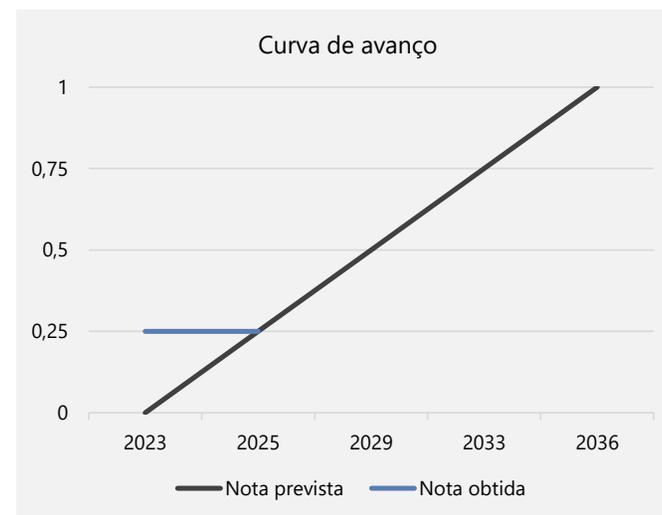


Ação 2.3.2.1 - Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo CBH

Ação	
Agenda	2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo
Subagenda	2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial
Programa	2.3.2 - Melhoria, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa
Meta	Realização de estudo de avaliação da rede de monitoramento entre o 1º e 3º ano de vigência do PBH e execução de monitoramento(s).
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 600.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,50
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0,5
termo de referência do estudo concluído e monitoramento realizado	2025	0,25	
empresa contratada, estudo em elaboração e monitoramento realizado	2025	0,5	
estudo concluído e monitoramento realizado	2026	0,75	
estudo apresentado ao comitê e monitoramento realizado	2026	1	

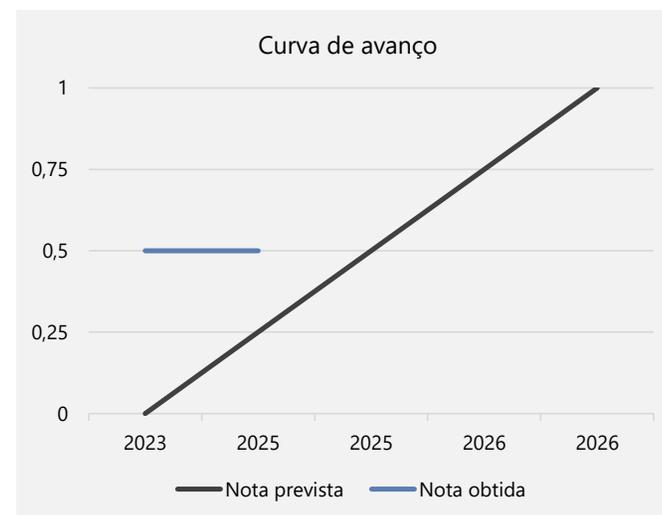


Ação 3.1.1.1 - Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário

Ação	
Agenda	3 - Saneamento Urbano e Rural
Subagenda	3.1 - Esgotamento Sanitário
Programa	3.1.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário
Meta	Assinatura de 3 acordos de cooperação técnica com os municípios hierarquizados para elaboração e execução de estudos, projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário
Atividades previstas	Elaborar e divulgar o ato convocatório para contratação de empresas especializadas para elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário Acompanhar a elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo do sistema de esgotamento sanitário Contratar gerenciadora para acompanhamento dos projetos contratados para a Etapa I
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 14.792.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	1,00
Atividades executadas	Contratação de empresas especializadas para elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário Elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo do sistema de esgotamento sanitário Contratação de gerenciadora para acompanhamento dos projetos contratados para a Etapa I Edital para projetos de esgotamento sanitário em áreas rurais elaborado e publicado, em andamento		
Principais constatações	Acordos assinados com os municípios de São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia. Contrato para elaboração dos projetos em andamento.		
Recomendações	-		

Ação 3.1.1.1 - Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum estudo ou projeto realizado	2023	0	1
1 estudo ou projeto realizado	2025	0,25	1
1 estudo ou projeto realizado	2029	0,5	
2 estudos ou projetos realizados	2033	0,75	
3 estudos ou projetos realizados	2036	1	

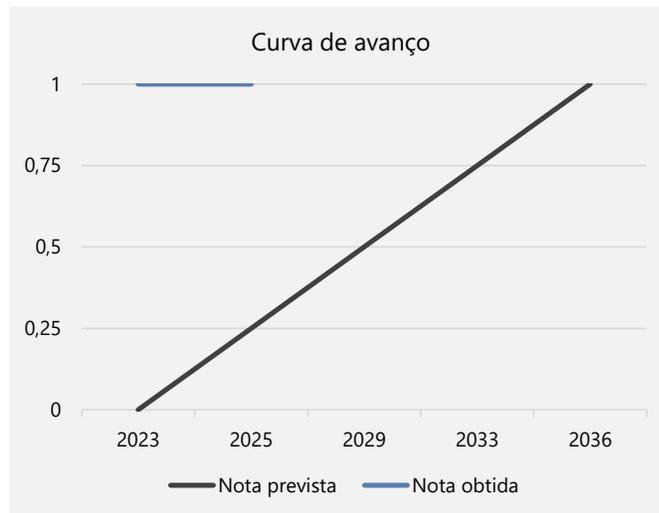


Ação 3.1.1.2 - Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP)

Ação	
Agenda	3 - Saneamento Urbano e Rural
Subagenda	3.1 - Esgotamento Sanitário
Programa	3.1.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário
Meta	Emissão de carta de contrapartida a 2 municípios ao longo da vigência do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 4.000.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, em atraso		
Nota prevista	1,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	Não houve inscrições de municípios da RH-IV para contrapartida.		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma carta emitida	2022	0	0
1 carta emitida	2022	0,25	0
1 carta emitida	2022	0,5	0
2 cartas emitidas	2023	0,75	0
2 cartas emitidas	2023	1	0

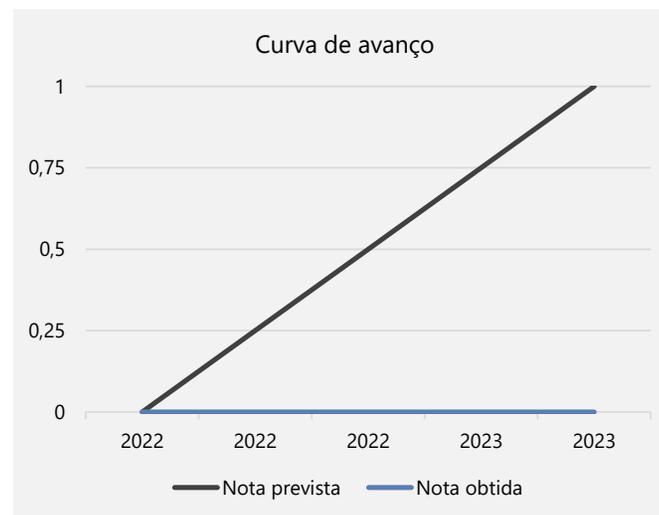

Ação 3.2.1.1 - Viabilizar relatório sobre resíduos sólidos para divulgação aos órgãos pertinentes

Ação	
Agenda	3 - Saneamento Urbano e Rural
Subagenda	3.2 - Resíduos Sólidos
Programa	3.2.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento das Áreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos
Meta	Divulgação de informações com base no estudo realizado no âmbito do PIRH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 4.460.000,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
1 oficina realizada	2031	0,25	0
1 reunião realizada	2032	0,5	0
proposta de divulgação elaborada	2032	0,75	0
divulgação realizada	2033	1	0




Ação 3.3.1.1 - Viabilizar relatório sobre drenagem urbana para divulgação aos órgãos pertinentes

Ação	
Agenda	3 - Saneamento Urbano e Rural
Subagenda	3.3 - Drenagem Urbana
Programa	3.3.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Drenagem Urbana
Meta	Divulgação de informações com base no levantamento realizado no âmbito do PIRH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 1.475.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2032	0	0
1 oficina realizada	2025	0,25	
1 reunião realizada	2029	0,5	
proposta de divulgação elaborada	2033	0,75	
divulgação realizada	2036	1	

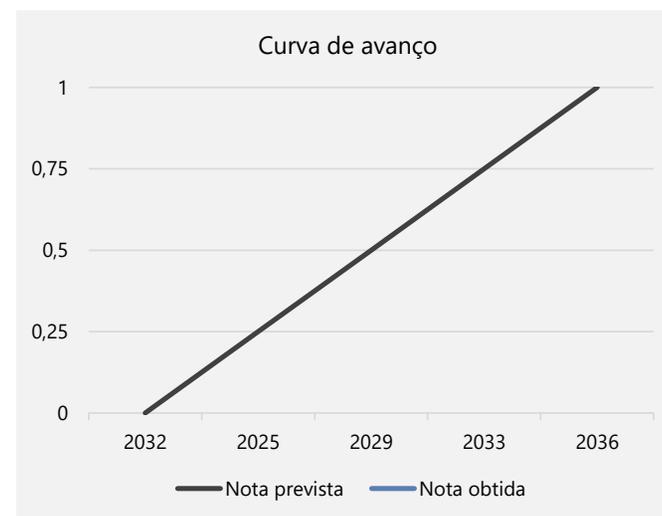


Ação 4.1.1.1 - Formalizar a indicação de bacias hidrográficas prioritárias para elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos

Ação	
Agenda	4 - Infraestrutura verde
Subagenda	4.1 - Planejamento Territorial
Programa	4.1.1 - Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias
Meta	Formalização das bacias hidrográficas prioritárias
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	1,00	Nota alcançada	1,00
Atividades executadas	-		
Principais	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
1ª reunião realizada	2022	0,25	1
2ª reunião realizada	2022	0,5	1
proposta de formalização elaborada	2023	0,75	1
formalização realizada	2023	1	1

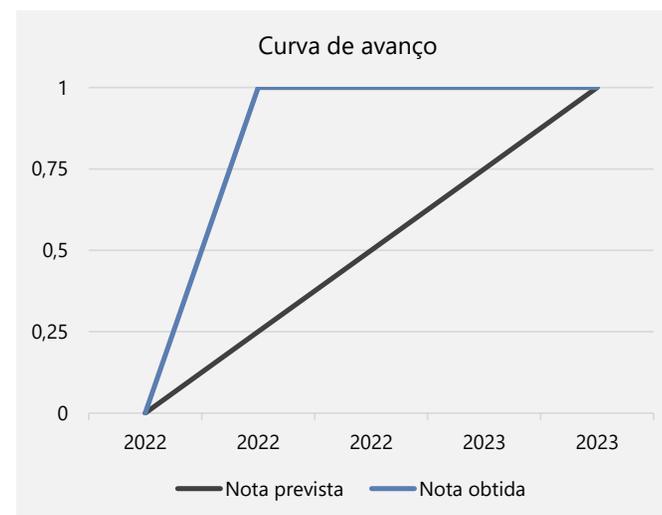


Ação 4.1.1.2 - Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos

Ação	
Agenda	4 - Infraestrutura verde
Subagenda	4.1 - Planejamento Territorial
Programa	4.1.1 - Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias
Meta	Desenvolvimento de 1 estudo, plano ou projeto com vistas à recuperação ambiental e ao manejo correto do solo voltados a preservação dos recursos hídricos
Atividades previstas	Acompanhar a contratação e a elaboração dos projetos
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 3.440.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,75
Atividades executadas	-		
Principais constatações	Atividades realizadas no âmbito do Mananciais.		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0,75
viabilização iniciada	2026	0,25	
projeto contratado	2026	0,5	
projeto em andamento	2027	0,75	
projeto finalizado	2028	1	

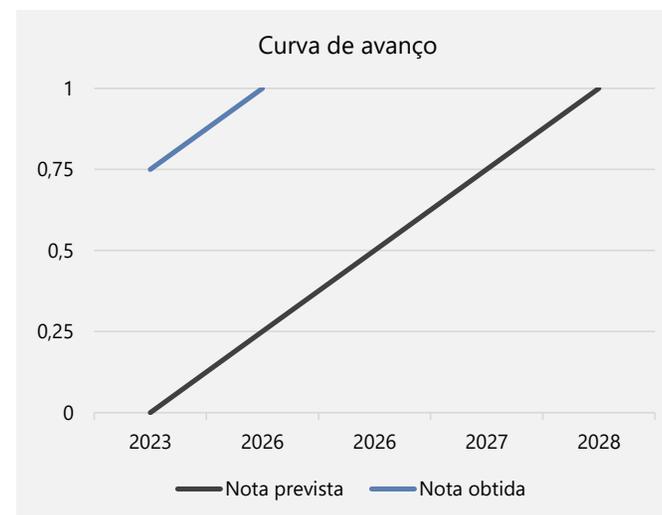


Ação 4.1.2.1 - Identificar, mobilizar e formalizar acordos e parcerias com vistas à execução de ações de recuperação ambiental e manejo do solo

Ação	
Agenda	4 - Infraestrutura verde
Subagenda	4.1 - Planejamento Territorial
Programa	4.1.2 - Mobilização Social visando à Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias
Meta	Formalização de 1 acordo de cooperação técnica com instituições estratégicas durante a vigência do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	1,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	Atividades realizadas no âmbito do Mananciais.		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum acordo realizado	2022	0	1
1ª reunião realizada	2026	0,25	
2ª reunião realizada	2027	0,5	
elaboração do acordo	2028	0,75	
acordo realizado	2029	1	

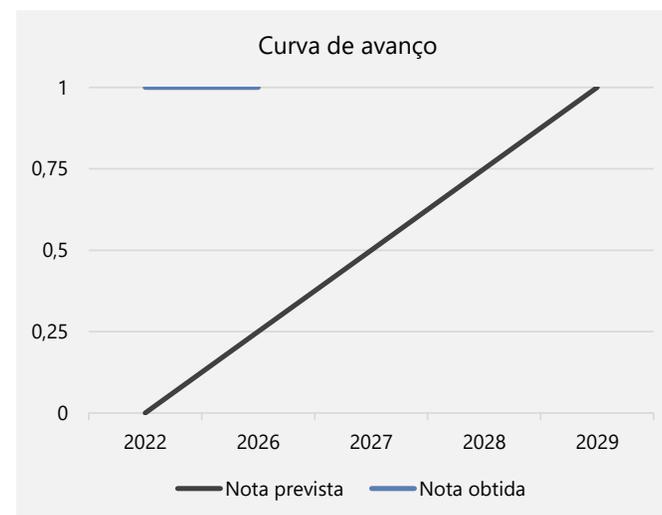


Ação 4.2.1.1 - Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos

Ação	
Agenda	4 - Infraestrutura verde
Subagenda	4.2 - Intervenções na Paisagens
Programa	4.2.1 - Restauração e Conservação de Bacias Hidrográficas e reabilitação de corpos hídricos
Meta	Execução de 1 projeto com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos
Atividades previstas	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais Analisar e definir a possibilidade de aporte de recurso conjunto Executar os projetos de conservação e reabilitação Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais Acompanhar as ações estruturais Participar das ações estruturais Contratar serviços especializados para implantação de marcos georreferenciados e placas na delimitação da Faixa Marginal de Proteção
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 2.929.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,75
Atividades executadas	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais Analisar e definir a possibilidade de aporte de recurso conjunto		
Principais constatações	Atividades realizadas no âmbito do Mananciais.		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum projeto executado	2022	0	0,75
elaboração de TDR	2028	0,25	
projeto contratado	2029	0,5	
projeto em andamento	2030	0,75	
projeto finalizado	2032	1	

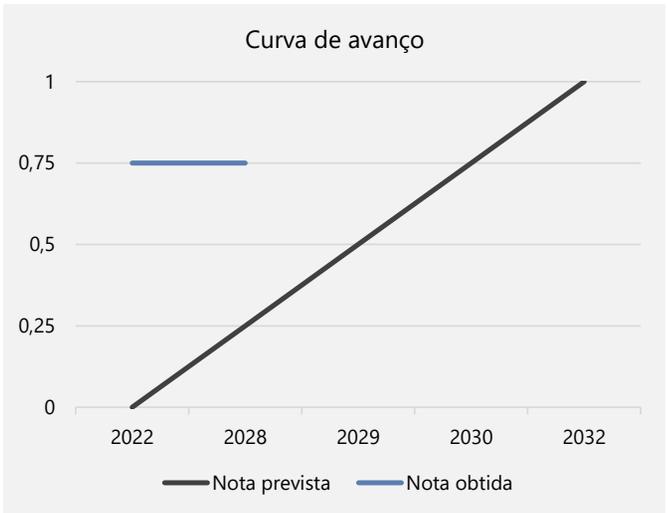


Ação 5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos

Ação	
Agenda	5 - Produção de conhecimento
Subagenda	5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico
Programa	5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão
Meta	Formalização de 5 instrumentos na vigência do PBH
Atividades previstas	Acompanhar Acordo de Cooperação Técnica com a Fiocruz Parceria com CNPq - Em substituição ao PROPESQUISA RH-IV Assinar Convênio com CNPq Acompanhar desenvolvimento do projeto com CNPq
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	#VALOR!

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Em andamento - Articulação com entidades de apoio à pesquisa para Convênio		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum instrumento formalizado	2023	0	0
1 instrumento formalizado	2025	0,25	
3 instrumentos formalizados	2029	0,5	
4 instrumentos formalizados	2033	0,75	
5 instrumentos formalizados	2036	1	

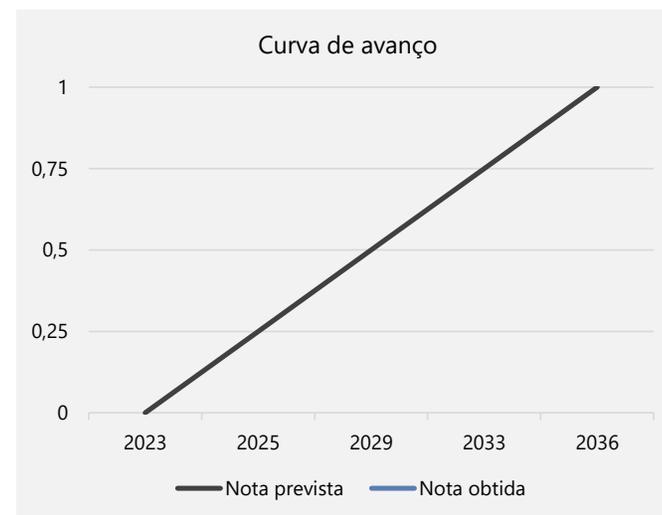


Ação 6.1.1.1 - Realizar a revisão do Plano de Ações de Comunicação

Ação	
Agenda	6 - Comunicação e Educação Ambiental
Subagenda	6.1 - Comunicação
Programa	6.1.1 - Gestão de Comunicação
Meta	Realização de 8 revisões do Plano de Ações de Comunicação
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma revisão realizada	2023	0	0
2ª revisão realizada	2024	0,25	0,25
4ª revisão realizada	2028	0,5	
6ª revisão realizada	2032	0,75	
8ª revisão em andamento	2036	1	

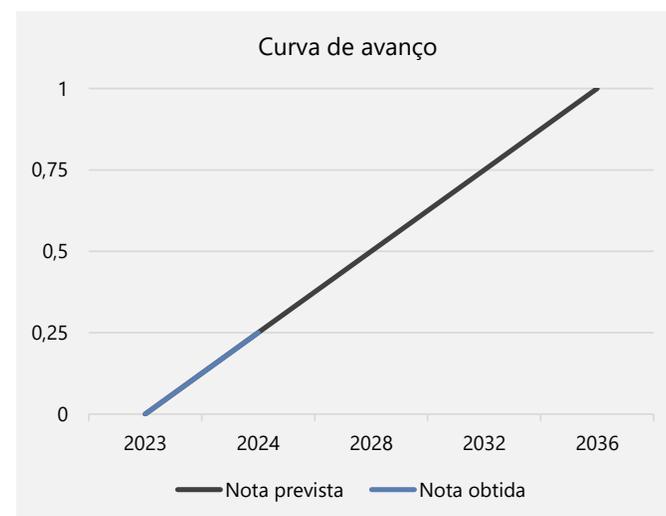


Ação 6.1.1.2 - Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação

Ação	
Agenda	6 - Comunicação e Educação Ambiental
Subagenda	6.1 - Comunicação
Programa	6.1.1 - Gestão de Comunicação
Meta	Executar 70% das atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação
Atividades previstas	Executar as atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação; Elaborar relatório contendo comprovação da execução das atividades; Apresentar relatório na plenária do CBH; Contratar novo site; Impressão e distribuição do Resumo Executivo do Plano de Bacia
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 450.000,00

Resultados	
Status da execução	Em execução, no prazo
Nota prevista	0,00
Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Atividades executadas conforme Plano de Ações Contratação de novo site e impressão e distribuição do Resumo Executivo do Plano de Bacia
Principais constatações	-
Recomendações	-

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum relatório entregue	2023	0	0
4 relatórios entregues	2025	0,25	
8 relatórios entregues	2029	0,5	
12 relatórios entregues	2033	0,75	
15 relatórios entregues	2036	1	

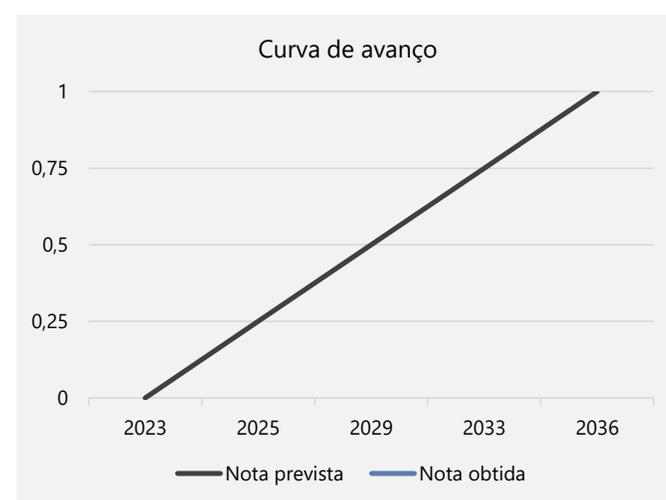

Ação 6.2.1.1 - Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos

Ação	
Agenda	6 - Comunicação e Educação Ambiental
Subagenda	6.2 - Educação Ambiental
Programa	6.2.1 - Educação Ambiental
Meta	Realização de 15 ações de educação ambiental
Atividades previstas	Mobilizar e organizar ações de educação ambiental Realizar ações de educação ambiental Contratar empresa para implementar o Projeto de Mobilização e Educação Ambiental
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 240.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,25
Atividades executadas	-		
Principais	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum evento realizado	2023	0	0,25
4 ações realizadas	2025	0,25	
8 ações realizadas	2029	0,5	
12 ações realizadas	2033	0,75	
15 ações realizadas	2036	1	

